TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____
U. ref. _____
VERSLAG NR.: 14/110309/03

09/252 45 45
Van de Candelaere

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Haeyershoek 31 BRAKEL
EIGENAAR: K. Van de Candelaere
Adres:
OPDRACHTGEVER: Voltonomy SPRL. Marsieres
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK: 0811.563 465

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 09/03/2011. Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:
~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Zonnepanelen
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting TECO A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type D-f/03A/40A.
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 1 bijgepl. ; RA: 11,00 Ohm; RI tot ___ MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: AD2

BESCHRIJVING:
PV installatie: 30 panelen (30 x 190 Wp).
Omvormer FRONIUS 1G 60 HV - 21475339/60 - 4600 Wmax.
Leiding: XVB 3G6 - 2P Ant 20 - 4P Ant 40 - D-f/03A (ALSB)
Kwh meter poen: 92,70 Watt.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:
Nota's: zie sticker (punt 1 → 4)

NOTA'S:

1. De controle beperkt zich tot de PV-Installatie.
2. Geen isolatie-meting mogelijk door aanwezigheid van elektronica.
3. De werkingstest van de ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.
4. De overeenkomst tussen karakteristieken van omvormer(s) en panelen en behoort niet tot deze controle.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. ~~De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en~~ de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
14 Cr 2013

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP

Schéma implantation électrique

Chef d'équipe : BILAL

Client:

Ville:

Date: 16/02/2021

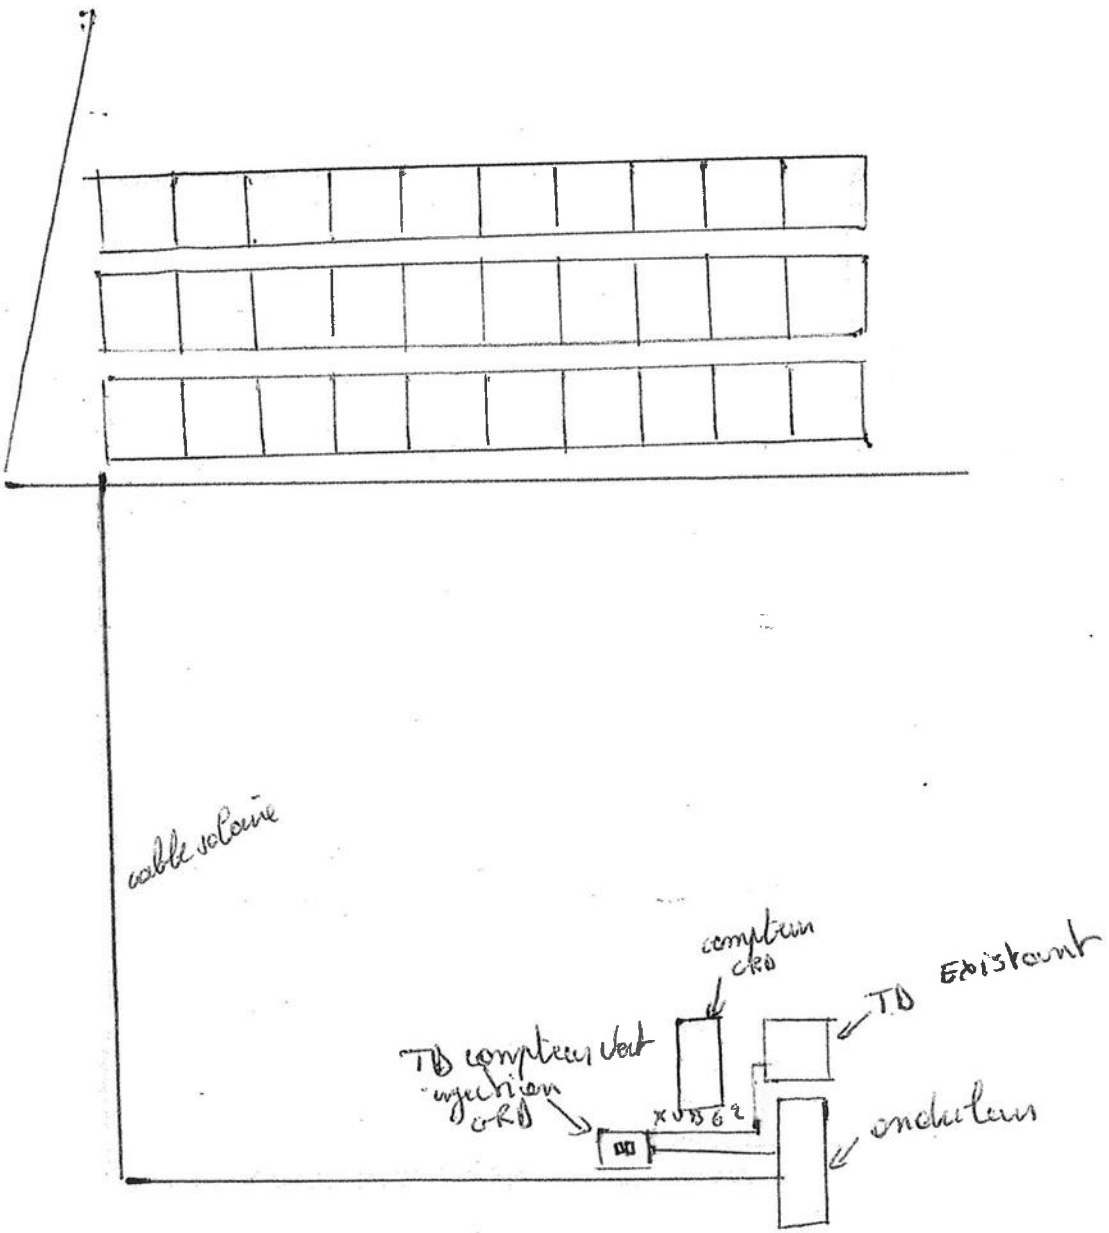

GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE PUISSANCE CRÊTE : ..... Wc

30... Panneaux de marque Enfinity ...190... Wc

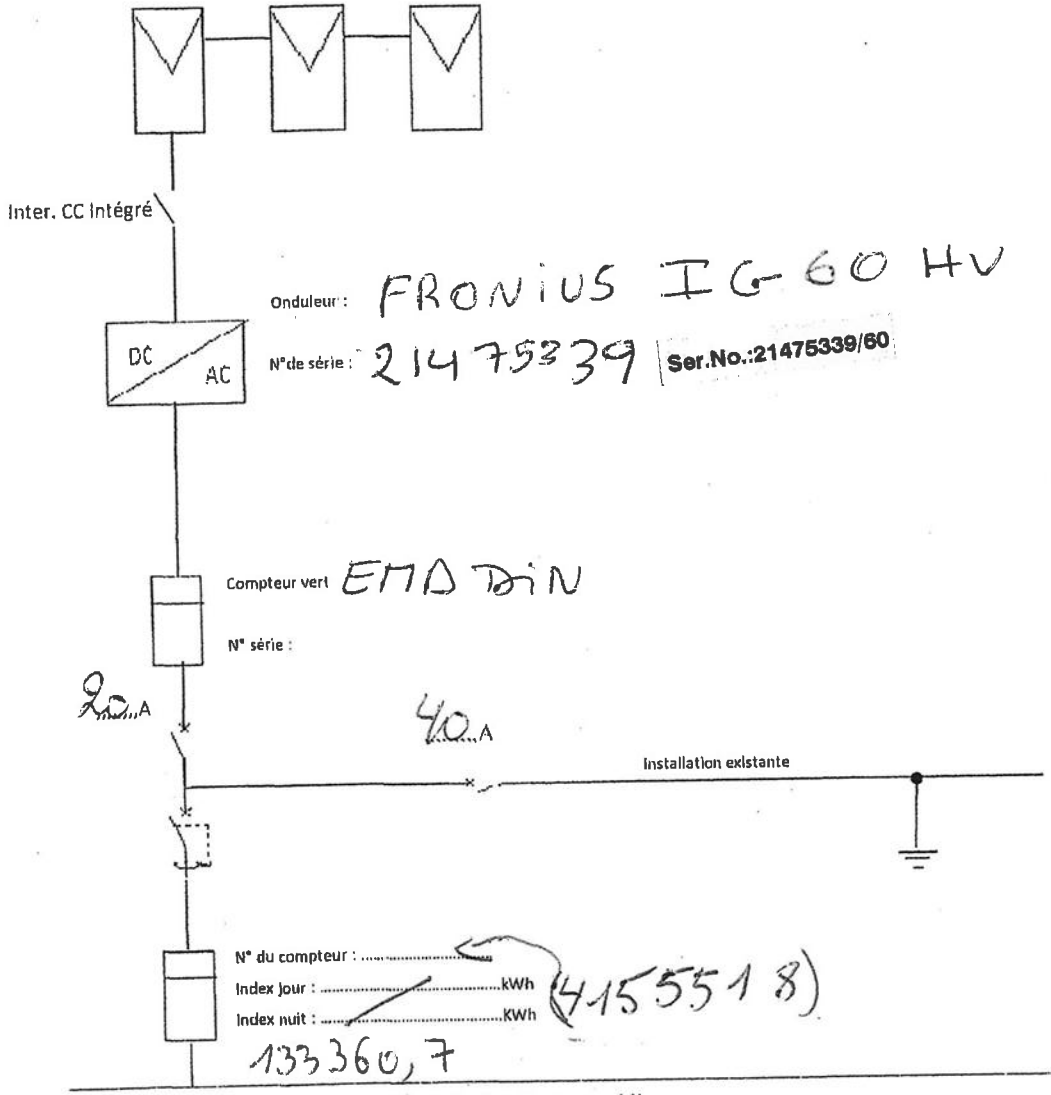

Coordonnées client		Nom: VANDECANDELAERE Luc	Contact Voltonomy		Modifications	volt nomy
Code EAN :		Adresse: HAEYERSHEEK 31	Tel :	065 40 89 20		
Téléphone :	0	9660 Brakel	Fax :	065 40 89 28		

Numéros de série

Chef d'équipe :

Client:

Ville:

Date:

1	H 11 00 92 11 786
2	H 11 00 92 11 667
3	H 11 00 92 11 751
4	H 11 00 92 11 736
5	H 11 00 92 11 478
6	H 11 00 92 11 468
7	H 11 00 92 11 814
8	H 11 00 92 11 748
9	H 11 00 92 11 639
10	H 11 00 92 11 672
11	H 11 00 92 11 868
12	H 11 00 92 11 711
13	H 11 00 92 11 701
14	H 11 00 92 11 889
15	H 11 00 92 11 691
16	H 11 00 92 11 616
17	H 11 00 92 11 753
18	H 11 00 92 11 996
19	H 11 00 92 11 594
20	H 11 00 92 11 606
21	H 11 00 92 11 824
22	H 11 00 92 11 676
23	H 11 00 92 11 670
24	H 11 00 92 11 442
25	H 11 00 92 11 389
26	H 11 00 92 11 304
~~27~~	~~H 11 00 92 11 679~~
28	H 11 00 92 11 554
28	H 11 00 92 11 323
29	H 11 00 92 11 629
30	H 11 00 92 11 641
